
Allestim. Cantiere
Indagini 1
Montaggio ponteggi
Indagini 2
Demoliz, rimoz
Condutture impianti
Opere di restauro interne
Opere di restauro esterne
Impianto elettrico
Smontaggio ponteggio
Smobilizzo cantiere

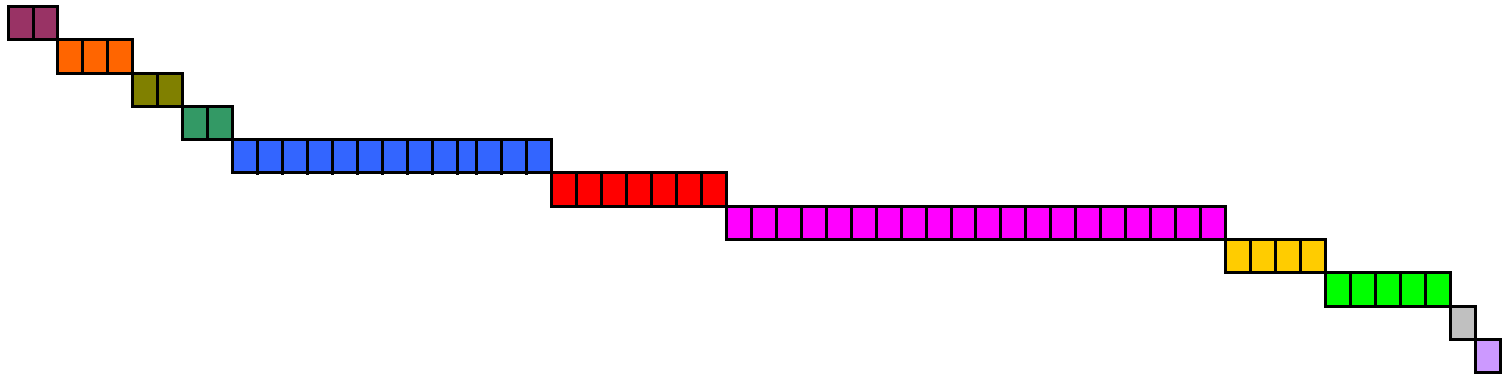

15.02.12 17.02.12 22.02.12 0.02.12 28.02.12 16.03.12 3.03.12 2.04.12 4.05.12 11.05.12 **14.05.12**

giornata lavorativa
